

Bon de commande / devis

Vénitien extérieur Metalunic V



N° Client

Nom

Adresse

Agence

Date

☐ Devis

☐ Commande

Réf. Chantier


N° de commande

Réf.	Quantité	HL (400-4000)	BK (700-2800)	Montage		Moteur		Position du moteur depuis l'intérieur		Option couvercle/caisson (solo en montage intramuros)		
				Intramural	Extramural	Filaire	Radio	Droite	Gauche	Devant	Double	Caisson tunnel

Prendre des mesures:
BK Intramural = Largeur travée creux -4 mm
BK Extramural = Largeur travée creux +70 mm
HL x BK ≤ 8 m2

Observations

N° de commande

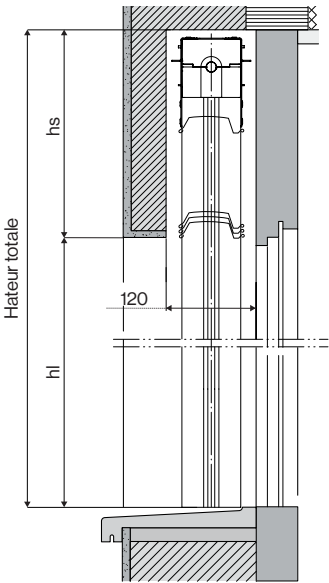

hl: hauteur travée
 hs: hauteur niche

Metaluniv V Standart

hl	hs	Hateur totale
1000	270	1270
1050	270	1320
1100	270	1370
1150	275	1425
1200	280	1480
1250	285	1535
1300	295	1595
1350	295	1645
1400	300	1700
1450	305	1755
1500	310	1810
1550	315	1865
1600	325	1925
1650	325	1975
1700	330	2030
1750	340	2090
1800	340	2140
1850	350	2200
1900	355	2255
1950	355	2305
2000	365	2365

hl	hs	Hateur totale
2050	370	2420
2100	370	2470
2150	380	2530
2200	390	2590
2250	390	2640
2300	395	2695
2350	405	2755
2400	405	2805
2450	410	2860
2500	415	2915
2550	420	2970
2600	430	3030
2650	435	3085
2700	435	3135
2750	445	3195
2800	450	3250
2850	450	3300
2900	460	3360
2950	470	3420
3000	470	3470
3050	475	3525

hl	hs	Hateur totale
3100	480	3580
3150	485	3635
3200	490	3690
3250	500	3750
3300	500	3800
3350	510	3860
3400	515	3915
3450	515	3965
3500	525	4025
3550	530	4080
3600	530	4130
3650	540	4190
3700	540	4240
3750	550	4300
3800	555	4355
3850	555	4405
3900	565	4465
3950	570	4520
4000	575	4575

Metaluniv V Sinus

hl	hs	Hateur totale
1000	270	1270
1050	270	1320
1100	270	1370
1150	270	1420
1200	280	1480
1250	280	1530
1300	280	1580
1350	290	1640
1400	300	1700
1450	305	1755
1500	315	1815
1550	320	1870
1600	320	1920
1650	325	1975
1700	335	2035
1750	335	2085
1800	345	2145
1850	355	2205
1900	355	2255
1950	360	2310
2000	370	2370


hl	hs	Hateur totale
2050	370	2420
2100	380	2480
2150	385	2535
2200	385	2585
2250	395	2645
2300	395	2695
2350	400	2750
2400	410	2810
2450	410	2860
2500	420	2920
2550	425	2975
2600	425	3025
2650	435	3085
2700	435	3135
2750	445	3195
2800	450	3250
2850	450	3300
2900	460	3360
2950	465	3415
3000	470	3470
3050	480	3530

hl	hs	Hateur totale
3100	480	3580
3150	485	3635
3200	495	3695
3250	495	3745
3300	505	3805
3350	505	3855
3400	510	3910
3450	520	3970
3500	520	4020
3550	530	4080
3600	540	4140
3650	540	4190
3700	545	4245
3750	555	4305
3800	555	4355
3850	560	4410
3900	565	4465
3950	570	4520
4000	575	4575


Lame

Lame couleur

☐ Standart




☐ Sinus




Option couvercle/caisson (montage intramural uniquement)


Devant



Double




Caisson tunnel




Montage

Intramural



Extramural



Signature du administration

Imprimer

Enregistrer

Supprimer

Envoyer
