

Folha de encomenda / orçamento

Veneziana exterior Lamisol III



Nº Cliente

Nome

Endereço

Agência

Data

☐ Orçamento

☐ Encomenda

Ref. Trabalho

Nº Pedido


Cor lâmina

Ref.	Quantidade	HL (400 - 4300)	BK (590 - 4500)	Lâmina		Montagem		Motor		Posição motor a partir de dentro		Opção tampa/caixa (apenas em montagem intramuros)		
				70	90	Intramuros	Extramuros	Mec.	Rádio	Dir.	Esq.	Frontal	Dupla	Caixa túnel

Tomar medidas:
BK Intramuros Fix L = Largura luz cavidade -4 mm
BK Extramuros Fix L = Largura luz cavidade +40 mm

HL x BK ≤ 10 m2

Observações

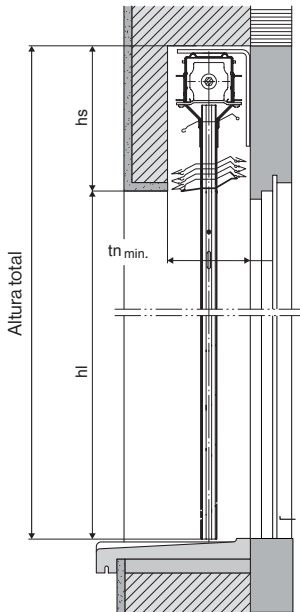

hl: altura luz
 hs: altura nicho
 tn lamisol III 70 = 100 mm
 tn lamisol III 90 = 130 mm

Lamisol III 70

hl	hs	Altura total
1300	205	1505
1350	205	1555
1400	210	1610
1450	215	1665
1500	220	1720
1550	220	1770
1600	220	1820
1650	225	1875
1700	230	1930
1750	235	1985
1800	235	2035
1850	240	2090
1900	245	2145
1950	245	2195
2000	250	2250
2050	250	2300
2100	255	2355
2150	260	2410
2200	265	2465
2250	265	2515
2300	270	2570

hl	hs	Altura total
2350	275	2625
2400	275	2675
2450	280	2730
2500	285	2785
2550	285	2835
2600	290	2890
2650	295	2945
2700	300	3000
2750	300	3050
2800	305	3105
2850	305	3155
2900	310	3210
2950	315	3265
3000	315	3315
3050	320	3370
3100	325	3425
3150	330	3480
3200	330	3530
3250	335	3585
3300	335	3635
3350	340	3690

hl	hs	Altura total
3400	345	3745
3450	345	3795
3500	350	3850
3550	355	3905
3600	360	3960
3650	360	4010
3700	365	4065
3750	365	4115
3800	370	4170
3850	375	4225
3900	380	4280
3950	380	4330
4000	385	4385
4050	390	4440
4100	395	4495
4150	395	4545
4200	395	4595
4250	400	4650
4300	405	4705


Lamisol III 90

hl	hs	Altura total
1800	225	2025
1850	230	2080
1900	230	2130
1950	230	2180
2000	235	2235
2050	235	2285
2100	240	2340
2150	245	2395
2200	245	2445
2250	250	2500
2300	250	2550
2350	255	2605
2400	260	2660
2450	260	2710
2500	260	2760
2550	265	2815
2600	265	2865
2650	270	2920
2700	275	2975
2750	275	3025
2800	280	3080


hl	hs	Altura total
2850	285	3135
2900	285	3185
2950	290	3240
3000	290	3290
3050	290	3340
3100	295	3395
3150	295	3445
3200	300	3500
3250	305	3555
3300	305	3605
3350	310	3660
3400	315	3715
3450	315	3765
3500	320	3820
3550	325	3875
3600	325	3925
3650	325	3975
3700	330	4030
3750	330	4080
3800	335	4135
3850	340	4190

hl	hs	Altura total
3900	340	4240
3950	345	4295
4000	350	4350
4050	350	4400
4100	355	4455
4150	355	4505
4200	355	4555
4250	360	4610
4300	365	4665

Opção tampa/caixa (apenas em montagem intramuros)

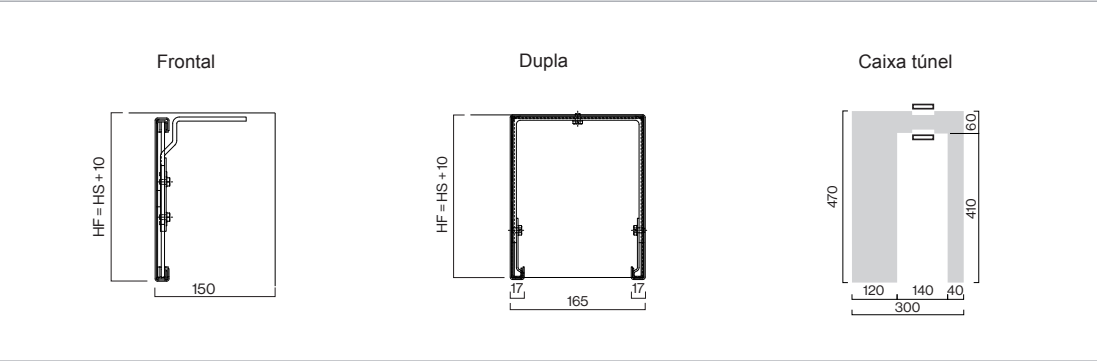

Montagem

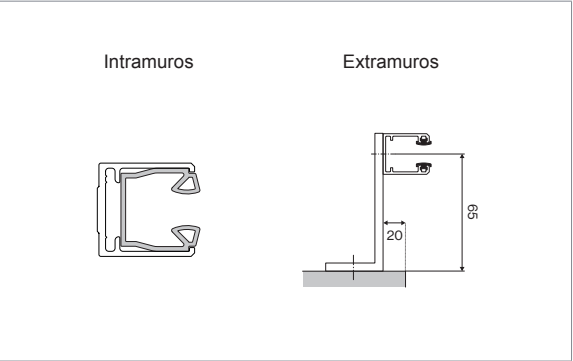

Assinatura de administração

Imprimir

Guardar

Apagar

Enviar
